แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานโครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน

****

๑. ชื่อโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ คทช. สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อย การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นที่ คทช.จังหวัดน่าน ระบบส่งน้ำฝายห้วยเฮี้ย

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๒,๐๐๐,๐๐๐		๑,๖๑๗,๐๑๖.๔๓	๓๘๒,๙๘๓.๕๗
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐		๑,๖๑๗,๐๑๖.๔๓	๓๘๒,๙๘๓.๕๗

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำเพื่อการเกษตร
๒. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค-บริโภค
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ให้สามารถ อยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
๔. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน คทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม

๔. เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ **วันที่** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน ๑๕๐ ไร่

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ขนาด ศก. ๔" ความยาวรวม ๒,๒๐๐ กม.
๖.๒ Air Valve ๔ แห่ง
๖.๓ Blow off ๒ แห่ง

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

- ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการมีระบบน้ำที่สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้จำนวนพื้นที่รับประโยชน์ ๙๕๐ ไร่ และมีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ




๘.๒ ขณะดำเนินการ




๘.๒ หลังดำเนินการ




<u>หมายเหตุ</u> กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

(/) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่ ๓๑/๐๘/๒๕๖๖

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

.....

.....

.....

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

.....

.....

.....

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานน่าน

วันที่ ๒๕/๐๘/๒๕๖๖

<u>หมายเหตุ</u> ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word)
ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน.สำนักงานโครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน

****

๑. ชื่อโครงการ เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง

กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

กิจกรรมย่อย การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร(ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยลีขวาง) ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๕๗,๗๔๒๔.๑๑	๑๒๒,๕๗๕.๘๙
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๕๗,๗๔๒๔.๑๑	๑๒๒,๕๗๕.๘๙

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

๔. เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ **สิ้นสุด** เมษายน ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย

- เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรจำนวน ๒๐๐ ไร่ ในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (<u>งบดำเนินงาน</u> : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/<u>งบลงทุน</u> : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ท่อส่งน้ำขนาด ๔ นิ้ว ความยาวประมาณ ๙๓๐ ม

๖.๒ ถังพักน้ำ ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ แห่ง

๖.๓ บ่อแยก จำนวน ๔ แห่ง

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ


๑. ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ ไร่


๒. เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

๓. ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ

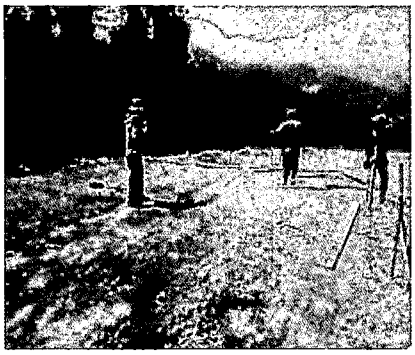




๘.๒ ขณะดำเนินการ

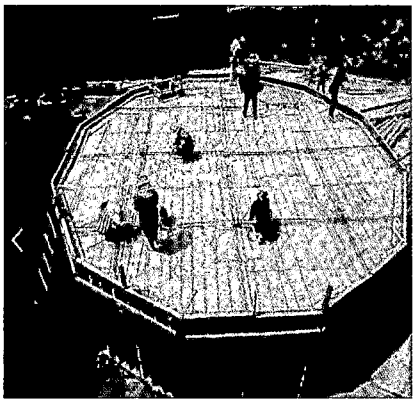



๘.๒ หลังดำเนินการ

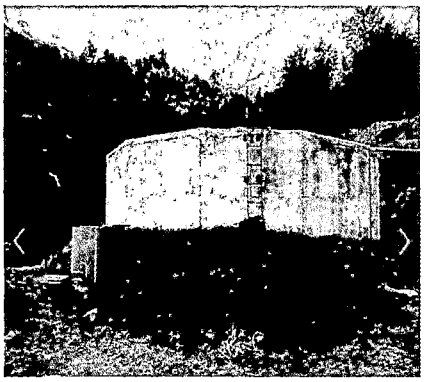



หมายเหตุ กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

(/) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

.....

.....

.....

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

.....

.....

.....

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานน่าน

วันที่ ๒๕/๐๗/๒๕๖๖

<u>หมายเหตุ</u> ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word)
ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานโครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน

****

๑. ชื่อโครงการ เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง

กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

กิจกรรมย่อย การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร (ระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม) ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐		๒๖๔,๓๘๓๙.๙๙	๑๓๖,๑๖๐.๐๑
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐		๒๖๔,๓๘๓๙.๙๙	๑๓๖,๑๖๐.๐๑

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน

๔. เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ **สิ้นสุด** เมษายน ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย

- ประชากรในพื้นที่ บ้านไผ่งาม ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน ๖๐๐ ไร่
- มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตและอาคารประกอบ ความยาวประมาณ ๑,๖๒๐ เมตร

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

๑. ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๖๐๐ ไร่

๒. ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ



๘.๒ ขณะดำเนินการ



๘.๒ หลังดำเนินการ



<u>หมายเหตุ</u> กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

(/) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่ ๓๑/๐๘/๒๕๖๖

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

.....

.....

.....

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

.....

.....

.....

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานน่าน

วันที่ ๒๕/๐๗/๒๕๖๖

<u>หมายเหตุ</u> ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word)
ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ
